

Localisation : Alloue



Chronologie:

- Etude continuité écologique + étude géotechnique (2014 – 2017)
 - 50 684.78 € TTC (pour les 19 ouvrages, 80% subventions)
- Effacement des ouvrages (2017)
 - 5 260 € TTC (financé à 100% par Appel à projet Agence eau AG)
- Mesures complémentaires (2019)
 - 2 520€ TTC (financées à 100% Appel à projet Agence eau AG)
- Suivi CarHyCE (Caractérisation hydromorphologique des cours d'eau) et IBG
 - 3 470 € TTC (financées à 100% Appel à projet Agence eau AG)


Ouverture centrale des ouvrages et suppression du seuil

Suppression du seuil

Avant travaux



Après travaux

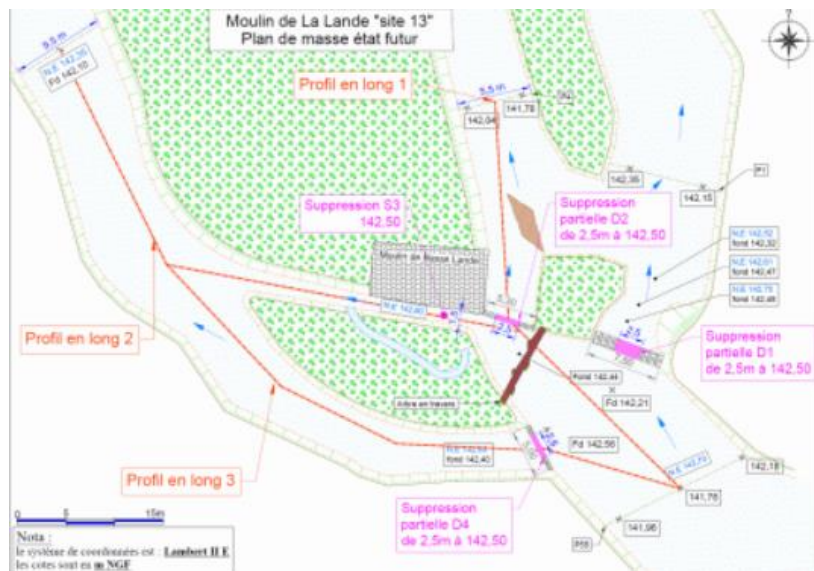

Avant travaux



Après travaux

Avant travaux

Après travaux




Suppression de la partie centrale des 3 déversoirs

Mesures complémentaires à l'effacement

Schéma :
Situation projetée

→ Suppression
d'arbres tombés
et embâcles

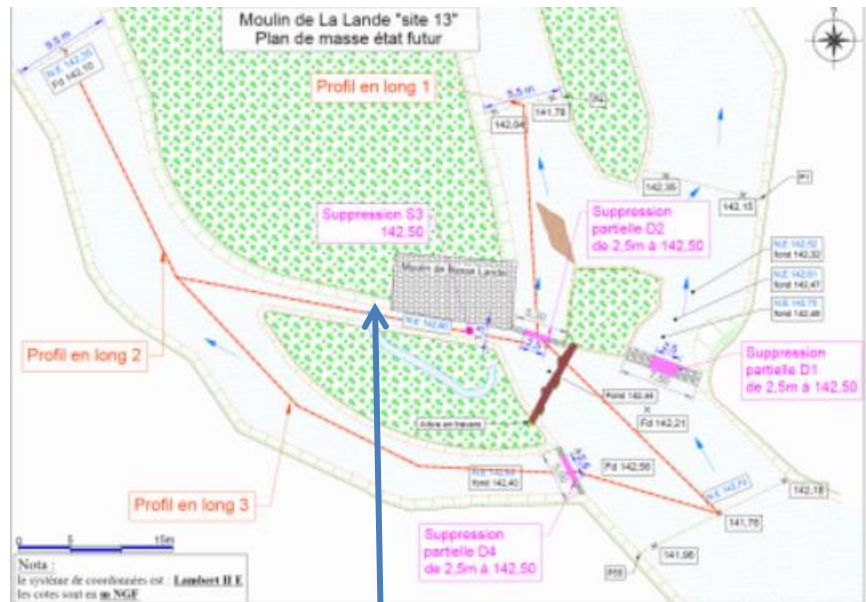

→ Mise en place d'une
protection de berge
(linéaire de berge de 9.60
m et environ 1.50 m de
large)



Berge avant travaux



Berge après travaux
